

18 de junio de 2007

Ing. Ramiro Lozano  
Director CEMEX, Ponce P. R.

Asunto: Situación del área de trabajo

Sr. Lozano:

La presente es para mantenerle informado de ciertos aspectos encontrados en las áreas de trabajo durante estos días. Estos son:

1. Personal de CEMEX se mantiene constantemente depositando desperdicios de metales en el área que nosotros utilizamos para colección de los mismos. Dicha práctica facilita a ambas partes el proceso pero el pasado viernes depositaron unos drones en el área y los mismos contenían residuos de aceite lo que causo un derrame el cual nosotros tuvimos que remediar. Esperamos la cooperación del personal con respecto a este junto para no causar derrames en ninguna área y que se tomen las debidas precauciones.
2. Con respecto a la remoción de asbestos la misma no ha sido completada en su totalidad lo que imposibilita la remoción en varias áreas todavía. Se ha mantenido comunicación directa con respecto a la situación con el Departamento de Asuntos Ambientales de CEMEX y los Ingenieros Juan Barroso y Juan Colon.
3. En el área de los hornos no se han drenado las tuberías de petróleo y tampoco se han reubicado las tuberías de utilidades. Estos aspectos no permiten que el área sea segura para nuestros empleados entrar de lleno a dismantelar. Los atrasos en estas tareas detienen el plan de trabajo establecido y por consecuente nos están creando aumento en las perdidas económicas.

El Plan de Trabajo para esta semana incluye:

#### Área de los Molinos-

- Terminar de cortar las piezas que todavía permanecen en el área de los molinos #2 y #5.
- Remover los paneles eléctricos del molino #5.
- Rellenar las bases de concreto en el área de los molinos.

Nota: En dicha área se completo la remoción de todo el equipo eléctrico entiéndase paneles, cajas, tuberías cables etc. en el espacio que comprende del molino # 2 al # 4.

#### Área de los Hornos-

- Drenaje de los motores.
- Remoción del equipo eléctrico.

#### Área del Tanque #10

- Cortar y remover los accesos del tanque.
- Remoción de tuberías y maquinaria dentro del tanque.

#### Área de Carga


- Finaliza el periodo de preparación y la tirada de concreto.

Virola- Se estará cortando la pieza con las medidas suministradas y se removerán las placas.

Se estarán rellinando todos los huecos en los lugares donde se han removido equipos eléctricos, bombas, cables y demás para eliminar de esta forma el riesgo a la seguridad en dichas áreas. Se utilizara el material que fue extraído de la zona de carga. Se obtuvo la autorización del Ing. Ramiro Lozano a través del Sr. Julio Mateo para esta tarea.



Derrame de Aceite en el área de carga por el personal de CEMEX

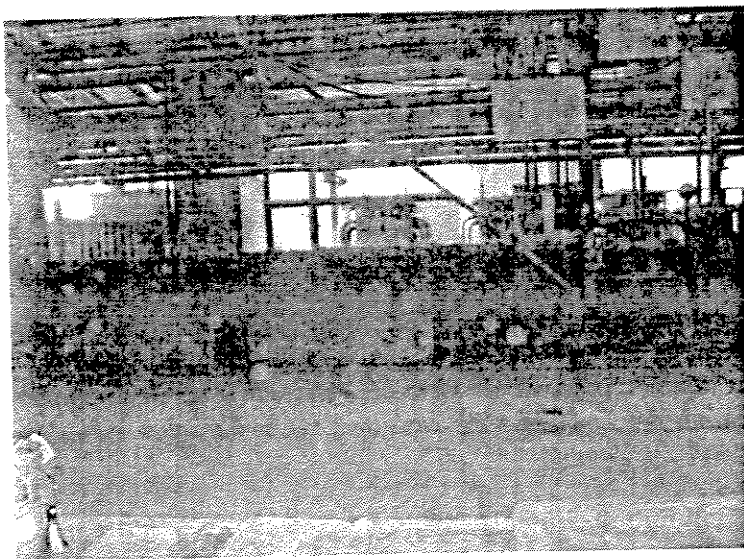

Área eléctrica de los molinos completada la remoción.

Para completar las tareas y el plan de trabajo cada semana se requiere la cooperación y atención del personal de CEMEX encargado de cada área.

Gracias por su atención;

Ing. Francine Arocho

Gerente de Proyecto

AWMR
